

REPORTES DE AVANCE DE OBRA

**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL
TIPO III**

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO 19 12 2017 DÍA MES AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN 19 10 2018 DÍA MES AÑO

FECHA 12 2 2018 DÍA MES AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUSTAVO A. MADERO

DOMICILIO COMPLETO Calle 638 No. 380 y Av 412 Colania, San Juan de Aragón
Deleg. Gustavo A. Madero

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
2017	Unidad Académica Departamental Ipo II	40,000.00	0.00	40,000.00	0%	0%	1925	2100	0%	Se ha iniciado el levantamiento del concreto de la cancha

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:


RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN ALBERTO CONZALEZ ROJAS

NOMBRE M. C. GERARDO MARCHANT CRIZ

CARGO JEFE DE DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

CORREO ELECTRONICO BHETOS@GAMM.COM

TEL 10 DIGITOS 2292167291


 M.C. GERARDO MARCHANT CRIZ
 DIRECTOR DEL INSTITUTO
 GUSTAVO A. MADERO
 DIRECCIÓN

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

PROYECTO (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PROYECTO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO


CALENDARIO DE OBRA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE
 FECHA DE INICIO: 05 / 03 / 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 / 03 / 2018

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUATEMALA, MADRID
 Calle 808 No. 305 y Av. 412 Colima, San Juan de Aragón
 Dept. Guatemala, México

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		RECURSO EJERCIDO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL						
2017	Unidad Académica Departamental tipo II	40,000.00	0.00	0%	1,000,000.00	1,000	1,000	0%	Sera incluido con la restitución de libros y derecho de libros

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: ALBERTO DONALDEZ ROSAS
 CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO ELECTRÓNICO: BDC@TAM.MEX.COM
 TEL. 49 DEDITOS: 22818729

FRMA: 



NOMBRE: VO BO DIRECTOR DEL INSTITUTO
 M.C. (SEMA) MARCHAMONT CORTI

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
 EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIA QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO
 PAM / FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 A 2017
 PÁGE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PÁGE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

Descripción de la obra:



REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
 SECRETARIA DE PLANEACION ECONOMICA Y DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFRASITRUCTURA ESCOLAR
 DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
 AREA DE INFRASITRUCTURA ESCOLAR Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRAS: SUBREGIONAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE: 12 4 2018
 DIA MES AÑO

FECHA DE INICIO: 13 10 2017
 DIA MES AÑO

FECHA DE TERMINACION: 31 12 2017
 DIA MES AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CUICTANZA MICHUEN
 CALLE 101 No. 3007 A, C. P. 37100, San Juan de los Rios, C. P. 37100, Michoacán, México

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
2017	Unidad Académica Deportivos I y II	40,000.00	0.00	40,000.00	0%	0%	1625	2126	14%	La obra se la obra con la construcción y habilitación de edificio

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:



RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
 NOMBRE: ALBERTO GONZALEZ ROSAS
 CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
 CORREO ELECTRONICO: BRET@TNAI.COM
 TEL. 10 DIGITOS: 226187231

VOBO DIRECTOR DE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CUICTANZA MICHUEN
 M.C. GERARDO MORALES GARCIA
 NOMBRE: VBOBO DIRECTOR DE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CUICTANZA MICHUEN
 M.C. GERARDO MORALES GARCIA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, JUSTIFICACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PARA EL FONDO DE PROGRAMACIONES MULTISECTORIALES (2014 A 2017)
 PARA EL FONDO DE PROGRAMACIONES MULTISECTORIALES DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROYECTO/PROGRAMA PRESUPUESTAL/CAMPAÑA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014 2015 Y 2016)
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO SECRETARIA DE PLANEACION ECONOMICA Y DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFRASITRUCTURA ESCOLAR DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA AREA DE INFRASITRUCTURA ESCOLAR Y MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA
			DESCRIPCION DE LA OBRA
			DESCRIPCION DE LA OBRA

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y FINANCIACIÓN
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUATEMALA MAERIO
 CONSIGLIO COMPLETO: Calle 23 No. 2039 A-1, Antigua, Guatemala, Guatemala
 Dpto. Guatemala, Guatemala

CALENDARIO DE OBRA GUÍA GLOBAL CONTRATADA
 FECHA DEL REPORTE: 08 / 08 / 2018
 FECHA DE INICIO: 01 / 01 / 2018
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 / 12 / 2018

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA ESCOLAR (CICLO ESCOLAR INICIAL)	MATRÍCULA ESCOLAR (CICLO ESCOLAR FINAL)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
2017	Unidad Académica (Educación Básica II)	40 000.00	0.00	40 000.00	0%	0%	15/12	21/08	15%	Ajustamiento de este presupuesto en la estructura del cobro y auditoría del edificio.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
 NOMBRE: ALBERTO GONZÁLEZ ROMÁN
 CASO: OFICINA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO ELECTRÓNICO: alberto.gonzalez@tecnologico.mx
 TEL. DE CONTACTO: 2220 12 020

FORMA: [Firma manuscrita]

NOMBRE: M.C. GERARDO MACHUCA ORTIZ
HILO OFICIAL: [Firma manuscrita]

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO
 PARA EL FONDO DE PARTICIPACIÓN MUESTRAL 2017 A 2019
 PARA EL FONDO DE PARTICIPACIÓN MUESTRAL 2018 A 2019
 PROYECTO/PROGRAMA: PRESUPUESTACIÓN EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIÓN 01/4/2018 Y 2016)
DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017	
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y FINANCIACIÓN ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FOTOGRAFÍA DE LA OBRA

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA: SIMA GASOBAL CONTRATADA
 FECHA DEL REPORTE: _____
 FECHA DE INICIO: _____
 FECHA DE TERMINACIÓN: _____

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUINTANA ROO
 Calle 668 No. 3007 A y C, Colonia San Juan del Arroyo
 Del. Cuernavaca, México

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATERIA CÍCLICA RECLAR CÍCLICO INICIAL	MATERIA CÍCLICA RECLAR CÍCLICO FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
PROYECTO 2016	Unidad Académica Destemperedados I	36,594,542.82	0.00	36,594,542.82	98.0421%	22%	10/01	21/01	27%	Acabados de obra integrados en los trabajos de obra y mobiliario de edificio



COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: ALBERTO GONZÁLEZ RIVERA
 CARGO: JEFE DEL DEPTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO ELECTRÓNICO: SISTRON@TNCM.COM
 TEL. 16 DÍGITOS: 221070791

SELO OFICIAL S.E.P.
 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
 EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIA QUE SE OTORGA POR EL BANCO DE MÉXICO
 FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO
 FIRMAS DE AUTORIDADES MÚLTIPLES (2014-2017)
 FASE PROGRAMA PARA LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
 PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIÓN 1.2714.2014 Y 2016)
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017	
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA	FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
 SECRETARIA DE PLANEACION ECONOMICA Y DESARROLLO SOCIAL
 DIRECCION DE INFORMACION, INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLÓGICA
 AREA DE MANEJO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO 19 12 2017
 DIA MES AÑO

FECHA DE TERMINACION 19 12 2018
 DIA MES AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUAYMAS A MAJURO
 DOMICILIO CARRETERA FEDERAL 3003 Y AV. 412 Colonia San Juan de Aragón
 COMPLETO Guaymas A. México

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CIRCULAR INICIAL	MATRÍCULA CIRCULAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
PROGUE 2016	Unidad Académica Deportativa I Ed. II	96 594 542 97	0 00	130%	33%	\$1 437 741 76	1825	2 100	29%	Actualmente se está trabajando en el armado de la estructura mediante de malla de acero y concreto

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:



RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 NOMBRE: ALBERTO GONZALEZ ROSAS
 CARGO: JEFE DEL DEPT. DE MANEJO DE INFORMACION, PROGRAMACION E INVESTIGACION
 CORREO ELECTRONICO: BERTON@TNAO.MEX
 TEL. 19 DÍGITOS: 226123201

FECHA: 19/12/2018
 LUGAR: GUAYMAS A. MEXICO

NOBRE: VIC. GERENTE ADMINISTRATIVO
 FIRMA: VIC. GERENTE ADMINISTRATIVO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
 EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO
 FAN (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 A 2017)
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROEDIPROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017	
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO SECRETARIA DE PLANEACION ECONOMICA Y DESARROLLO SOCIAL DIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION E INFRAESTRUCTURA FISICA AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA
	
LEYENDA: AMBITO DE IMPACTO DE PASADIZO, CONSTRUCCION DEL PASADIZO Y ARMADO DE CANTILLAS DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA OBRA
DESCRIPCION DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUAYMAS A. MAJURO
 DIRECCION

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CUSTAVIA MAIERO
 COMPLETO: Calle 606 No. 300, Av. 473 Colonia, San Juan de Aragón, CDMX
 Calle: _____ Día: _____ Mes: _____ Año: _____
 Dirección: _____

CALENDARIO DE OBRA SUJETA GLOBAL CONTRATADA
 FECHA DE INICIO: 19/12/2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 19/12/2017
 FECHA DEL REPORTE: _____

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CÍRCULO REGULAR INICIAL	MATRÍCULA CÍRCULO REGULAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FECHA	ETAPA		%	\$				
PROCESO 2016	Unidad Académica Desempeñada con II	30/04/2017	0.00	30,584,590.82	33%	\$10,447,741.76	1902	2100	40%	Actualizarse la esta información en la construcción de muros de tabique y el levantamiento de cunetas a bases de pavimento en cada lote para aplicar posteriormente el piso del primer o segundo piso de cada vivienda.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: ALBERTO GONZÁLEZ MEDAL
 CARGO: JEFE DEL SECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO ELECTRÓNICO: BME@TNA.MEX
 TEL. 15 DÍGITOS: 2281 19791

REVISADO POR
 NOMBRE: M.C. GERARDO MARTÍNEZ ORTEGA
 FIRMA: _____
 CARGO: DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CUSTAVIA MAIERO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO FINANCIERO Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

RAMA / FONDO DE APORTACIONES MULTISUBSISTEMAS 2015 A 2017
PROYECTO DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)
 PROYECTO DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL PROGRAMA PRELUPITARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.


2017
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

REPORTES DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE CARRERA DEL MATERIAL

REPERCIÓN DE LA OBRA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
S.E.P.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE FORMACIÓN EDUCACIONAL Y DESARROLLO DEL APRENDIZAJE TECNOLÓGICO
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INICIATIVAS
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA: 19 12 2017
 FECHA DEL REPORTE: 19 12 2017
 FECHA DE INICIO: 19 12 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 19 12 2017

CUATRO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUILACUA A. MADRERO
 DIRECCIÓN: Calle 688 No. 300 y Av. 473 Colinas, San Juan de los Ríos, Querétaro, Qro.
 C.P. 76100

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FONDA	ESTATAL		%	\$				
PROYECTO 2016	Unidad Académica Cuernavaca tipo II	36 34 842 87	0.00	100%	33%	\$ 112 427 741 76	1824	2104	25%	LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS PLANTA BAJA

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ALEJANDRO DOMÍNGUEZ ROSAS
 NOMBRE: M. GONZALO MARQUEZ CRUZ
 CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
 CORREO ELECTRONICO: BHE@TAMAIL.COM
 TEL. 16 DIRECTOS: 228219791
 FIRMA

YO SOY DIRECTOR DEL CENTRO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
 EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO



FAM (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES) 2014 A 2017
 PAPE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PRODEP (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES) 2014, 2016 Y 2016)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

REPORTES DE AVANCE DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FOTOGRAFÍA
LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA DEL ENLACE	
CONSTRUCCIÓN DE MURO PLANTA BAJA	



SEP
 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
 DIRECCIÓN

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
 SECRETARIA DE PLANEACION EVALUACION E INNOVACION INSTITUCIONAL
 DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION E INFRAESTRUCTURA FISCAL
 AREA DE INFRAESTRUCTURA FISCA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA SUJIA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DEL REPORTE
 FECHA
 DIA MES AÑO

FECHA DE INICIO
 DIA MES AÑO

FECHA DE TERMINACION
 DIA MES AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
 NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUSTAVO A. MADERO
 DOMICILIO Calle 685 No. 2072, Av. 571 Colima, San Juan de los Rios, Ensenada, Baja California Sur, México

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA ESCOLAR CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		EFECTIVA	TOTAL		%	\$				
PROYECTO 2016	Unidad Académica Digital (Unidad No 1)	30 594 240.00	0.00	30 594 240.00	100%	317 583 857.75	1825	2100	96%	LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS PLANTA BAJA

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:



RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 NOMBRE: ALBERTO GONZALEZ ROSAS
 CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION GOBIERNO ELECTORAL
 TEL. 10 DÍGITOS: 552218701

NOMBRE: VIGGO DIRECTOR DEL INSTITUTO
 FIRMA



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
 EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO
 PMAI (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD) PER (PROGRAMA EDUCATIVO URBANO)
 PMAI (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2014-2017)
 PMAI (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2014-2018)
 PMAI (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN E INNOVACION INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION E INFRAESTRUCTURA FISCA AREA DE INFRAESTRUCTURA FISCA Y MANTENIMIENTO	
ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)	 
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MUROS PLANTA BAJA

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INSTITUCIONALIDAD
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA RÚRAL
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RÚRAL Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA: SUMA GLOBAL CONTRATADA
 FECHA DEL REPORTE: 5 DIA 11 MES 2018 AÑO

FECHA DE INICIO: 13 MES 2018 AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN: 13 MES 2018 AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUANAJUATO - IADERO
 Calle 605 No. 300 X Av. 472 Colinas, San Juan de Aragón
 Del. Guadalupe, México



PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATA						
PROYECTO 2016	Unidad Académica Dependiente 196 II	38,594,542.92	0.00	38,594,542.92	18%	1625	2100	75%	AVANCE DE CONSTRUCCIÓN PRINCE PRISO

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: ALBERTO GONZALEZ ROMA
 NOMBRE: M.C. GERARDO MARCANI ONTIZ
 CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO ELECTRONICO: gmarcani@tecn.mx
 TEL. 10 DIGITOS: 4742012941
 FIRMA: 
 SELLO OFICIAL: 

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) INFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
 EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA YA PROYECTO CONCLUIDO
 PAF (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD) PARA (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)
 PAF (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014 A 2017)
 PAF (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROYECTO/PROGRAMA PRESUPUESTAL (INDICADOR DE AVANCE EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018		TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA RÚRAL Y MANTENIMIENTO	
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RÚRAL Y MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
	LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA DEL EMPICO Y COLOCACIÓN DE TENDONES Y ESTRUCTURA RESISTIDA FISO		CONSTRUCCIÓN DEL MUR DE SQUELADO FISO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUAYMAS A MAQUERO
 CALLE: No. 2007, Av. 472, Colonia: San Juan de Aragón, Guaymas, Coahuila de Zaragoza, México

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA
 FECHA DEL REPORTE: 15 DE MARZO DE 2018
 FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DE 2018

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA ESCOLAR CICLO ESCOLAR PASADO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
PROYECTO 2016	Línea de Acción "Acceso a la Educación" del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2018	36,944,542.22	0.00	36,944,542.52	100%	\$11,809,899.91	1205	2100	87%	ACTUALMENTE SE ESTÁ REALIZANDO LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA EN EL CANTÓN DE SAN JUAN DE ARAÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
 NOMBRE: ALBERTO GONZÁLEZ ROSAS
 CARGO: JEFE DEL DEPTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 TEL. CONTACTO: 521 273 2100
 CORREO ELECTRÓNICO: ALBERTO.GONZALEZ@TNP.MEX

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIA DE TRANSACCIONES FINANCIERAS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO
 PAQ (PROGRAMA DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
 PAQ (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROYECTO DE PRESUPUESTARIO EJERCIDO EN LA EDUCACIÓN: MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIÓN DE 2014 Y 2016)
DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE Y LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
AVANCE EN MÓDULO DE TABULES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO.		
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EXTERIOR DE EMERGENCIA.		

RESPONSABLE DE LA OBRA:

PAQ (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PIR (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUAYMAS A MAQUERO
 S.E.P.
 BLOQUE OFICIAL
 GUSTAVO A. MAQUERO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA


2019
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
 SECRETARIA DE PLANEACION ECONOMICA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL
 DIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION E INFRAESTRUCTURA FISICA
 AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO


CALENDARIO DE OBRA: DIAS, GLOBAL, CONTRATADA
 FECHA DEL REPORTE
 FECHA DE INICIO: DIA MES AÑO
 FECHA DE TERMINACION: DIA MES AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUERRERO, A.C.
 DOMICILIO COMPLETO: Carretera 100 No. 3007 A-417 Colima, San Juan de los Rios, Colima, Jalisco, México

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL						
PROCEGE 2016	Unidad Académica Experimental No. II	36,394,542.92	0.00	36,394,542.92	64% \$17,268,639.91	1925	2100	96%	COLOCACION DE CANCELERAS EN PASADIZO, COLOCACION DE ESCEN PARA ESCA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PISO E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA.

COMENTARIOS QUE CONTIENE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 NOMBRE: ALBERTO GONZALEZ ROSAS
 CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
 CORREO ELECTRONICO: BRETOS@TNAI.COM
 TEL. 10 DIGITOS: 22821921
 FIRMA: 



NOMBRE: M.C. GERARDO MARCHANTE URIBE
 CARGO: VICE DIRECTOR DEL INSTITUTO
 FIRMA: 

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSION, LICITACION PÚBLICA, INFORME FISCO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO
 PABE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROYECTO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERBOSOS 2014, 2015 Y 2016)
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2019
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN
 DEL PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUANAJUATO A MODO DOMICILIO
 DOMICILIO COMPLETO: Calle 502 No. 309 P. A. 1.ª planta, San Juan de los Ríos, Guanajuato, Gto.
 Dpto. Guanajuato, México


CALENDARIO DE OBRA, SUMA GLOBAL CONTRATADA
 FECHA DE INICIO: 15 / 03 / 2019
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 / 12 / 2019


FECHA DEL REPORTE
 FECHA: 27 / 08 / 2019


PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	REQUERIDO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE POR CÍCLO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
PROYECTO 2019	Unidad Académica Desempeño 1004 f	96,544,940.00	0.00	36,544,940.00	18%	\$11,938,959.91	1905	7200	100% PRIMERA PRÁCTICA EN SALA DE CLASES	DETALLES DE PLAN DE APLICACIÓN DE PRÁCTICA FINANCIERA DE FAMILIARIZACIÓN LABORAL EN SALA DE CLASES DE ECONOMÍA Y FINANZAS PERSONALES Y DE PLANEA

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
 NOMBRE: ALBERTO GONZÁLEZ BELLAS
 CARGO: JEFE DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO ELECTRÓNICO: BELLAS@TNAI.MEX
 TEL. 018 DÍGITOS: 22819731

FIRMA: 

NOMBRE: VOBO EMERSON MARTINEZ
 CARGO: JEFE DE SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 FIRMA: 

SELLO OFICIAL: 

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) Y/O INFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONTIENE RECIBOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA YA PROYECTO CONCLUIDO

PAIS: MÉXICO
 MUNICIPIO: GUANAJUATO
 LOCALIDAD: SAN JUAN DE LOS RÍOS
 CARRILLO DE ALBAZANO, 1004 F
 C.P.: 37000
 TEL. 018 DÍGITOS: 22819731

PROYECTO: 2019
 PROGRAMA: EDUCACIÓN SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
 SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.


DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO


2019
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN
 DEL PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:


 DETALLES DE PLAN DE APLICACIÓN DE PRÁCTICA FINANCIERA DE FAMILIARIZACIÓN LABORAL EN SALA DE CLASES DE ECONOMÍA Y FINANZAS PERSONALES Y DE PLANEA


 DETALLES DE PLAN DE APLICACIÓN DE PRÁCTICA FINANCIERA DE FAMILIARIZACIÓN LABORAL EN SALA DE CLASES DE ECONOMÍA Y FINANZAS PERSONALES Y DE PLANEA

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2019
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y PROFESIONALES
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

CALENDARIO DE OBRA: SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DEL REPORTE: _____

FECHA DE INICIO: _____

FECHA DE TERMINACION: _____

PROGRAMA Y LINEA: _____

CONCEPTO: _____

PROGRAMA Y LINEA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRICULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRICULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FISICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
		26,842,438.00	0.00	26,842,438.00	19%	\$ 5,099,273.89	6.5	27.0	86%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ALBERTO GONZALEZ RIVERA

CARGO: DIRECTOR DE EJECUCION DE PROGRAMAS CON PRESUPUESTO

FECHA: _____

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CON ORBE AL ALTO AL PRIMERO DE CADA OBRA

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA

ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONTIENE PRODUCTOS FINANCIEROS

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y PROFESIONALES

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y PROFESIONALES

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y PROFESIONALES

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA

REPORT DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019		TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y PROFESIONALES		SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS	
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y PROFESIONALES		SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS	
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y PROFESIONALES		SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS	
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y PROFESIONALES		SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS	
ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)		DESCRIPCION DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA
			



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ciudad de México, **26/JUNIO/2019**
DIR/ITGAM/0734/2019

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
P R E S E N T E

Por medio del presente y de la manera más atenta me dirijo a Usted para enviar el *Reporte del mes de Junio 2019*, el cual presenta un avance físico del 95% en planta baja y del 60% en el 1er. Piso de la Unidad Académica Departamental Tipo II del Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero.

Sin otro particular por el momento, envío afectuosos saludos.

A T E N T A M E N T E
Excelencia en Educación Tecnológica
"Compromiso a la Innovación de la Cultura"

M.C. PEDRO AZUARA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DEL ITGAM



S.E.P.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
GUSTAVO A. MADERO
DIRECCIÓN

c.c.p. Archivo

Calle 508 y Av. 412 No.300, Col. San Juan de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07470,
Ciudad de México



Tels. (55)26-51-62-75, (55)26-51-78-64,

www.itgustavoamadero.mx






**AVANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIÓNAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, Y OBRA EXTERIOR
 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

PRESUPUESTO FEDERAL AUTORIZADO \$ 36'594,542.92 CON IVA

MES	ORIGEN	MONTO EJERCIDO	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO
NOVIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 256,375.04	\$ 256,375.04	0.81%	0.81%
DICIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 256,197.84	\$ 512,572.88	0.81%	1.62%
ENERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 158,425.26	\$ 670,998.14	0.50%	2.13%
	OBRA	\$ -	\$ 670,998.14	0.00%	
	DRO	\$ -	\$ 670,998.14	0.00%	
FEBRERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 201,883.48	\$ 872,881.62	0.64%	8.04%
	OBRA	\$ 1,662,698.05	\$ 2,535,579.67	5.27%	
	DRO	\$ -	\$ 2,535,579.67	0.00%	
MARZO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 192,548.07	\$ 2,728,127.74	0.61%	15.19%
	OBRA	\$ 1,919,253.01	\$ 4,647,380.75	6.08%	
	DRO	\$ 144,757.24	\$ 4,792,137.99	0.46%	
ABRIL 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 195,719.16	\$ 4,987,857.15	0.62%	18.94%
	OBRA	\$ 985,601.51	\$ 5,973,458.66	3.12%	
	DRO	\$ -	\$ 5,973,458.66	0.00%	
MAYO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 224,636.51	\$ 6,198,095.17	0.71%	25.74%
	OBRA	\$ 1,923,368.92	\$ 8,121,464.09	6.10%	
	DRO	\$ -	\$ 8,121,464.09	0.00%	
JUNIO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 209,597.17	\$ 8,331,061.21	0.66%	34.46%
	OBRA	\$ 2,540,212.12	\$ 10,871,273.33	8.05%	
	DRO	\$ -	\$ 10,871,273.33	0.00%	

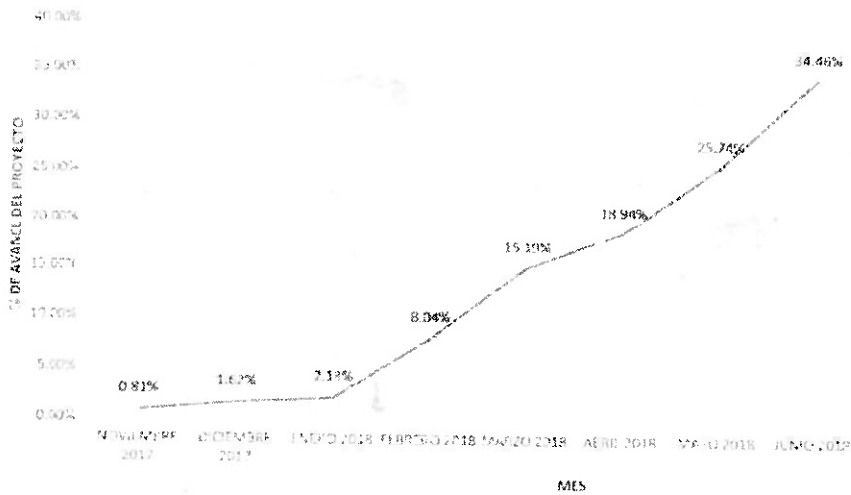




**AVANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, Y OBRA EXTERIOR
 AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

PRESUPUESTO FEDERAL AUTORIZADO \$ 36'594,542.92 CON IVA

MES	ORIGEN	MONTO EJERCIDO	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO
NOVIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 256,375.04	\$ 256,375.04	0.81%	0.81%
DICIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 256,197.84	\$ 512,572.88	0.81%	1.62%
ENERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 158,425.26	\$ 670,998.14	0.50%	2.13%
	OBRA	\$ -	\$ 670,998.14	0.00%	
	DRO	\$ -	\$ 670,998.14	0.00%	
FEBRERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 201,883.48	\$ 872,881.62	0.64%	8.04%
	OBRA	\$ 1,662,698.05	\$ 2,535,579.67	5.27%	
	DRO	\$ -	\$ 2,535,579.67	0.00%	
MARZO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 192,548.07	\$ 2,728,127.74	0.61%	15.19%
	OBRA	\$ 1,919,253.01	\$ 4,647,380.75	6.08%	
	DRO	\$ 144,757.24	\$ 4,792,137.99	0.46%	
ABRIL 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 195,719.16	\$ 4,987,857.15	0.62%	19.07%
	OBRA	\$ 985,601.51	\$ 5,973,458.66	3.12%	
	DRO	\$ 43,241.51	\$ 6,016,700.17	0.14%	
MAYO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 224,636.51	\$ 6,241,336.68	0.71%	25.93%
	OBRA	\$ 1,923,368.92	\$ 8,164,705.60	6.10%	
	DRO	\$ 15,781.10	\$ 8,180,486.70	0.05%	
JUNIO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 209,597.12	\$ 8,390,083.82	0.66%	34.68%
	OBRA	\$ 2,540,212.12	\$ 10,930,295.94	8.05%	
	DRO	\$ 9,468.66	\$ 10,939,764.60	0.03%	
JULIO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 270,698.41	\$ 11,210,463.01	0.86%	39.64%
	OBRA	\$ 1,283,217.16	\$ 12,493,680.17	4.07%	
	DRO	\$ 12,624.68	\$ 12,506,304.85	0.04%	
AGOSTO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 282,564.42	\$ 12,788,869.27	0.90%	55.74%
	OBRA	\$ 4,796,988.48	\$ 17,585,857.75	15.21%	
	DRO	\$ -	\$ 17,585,857.75	0.00%	

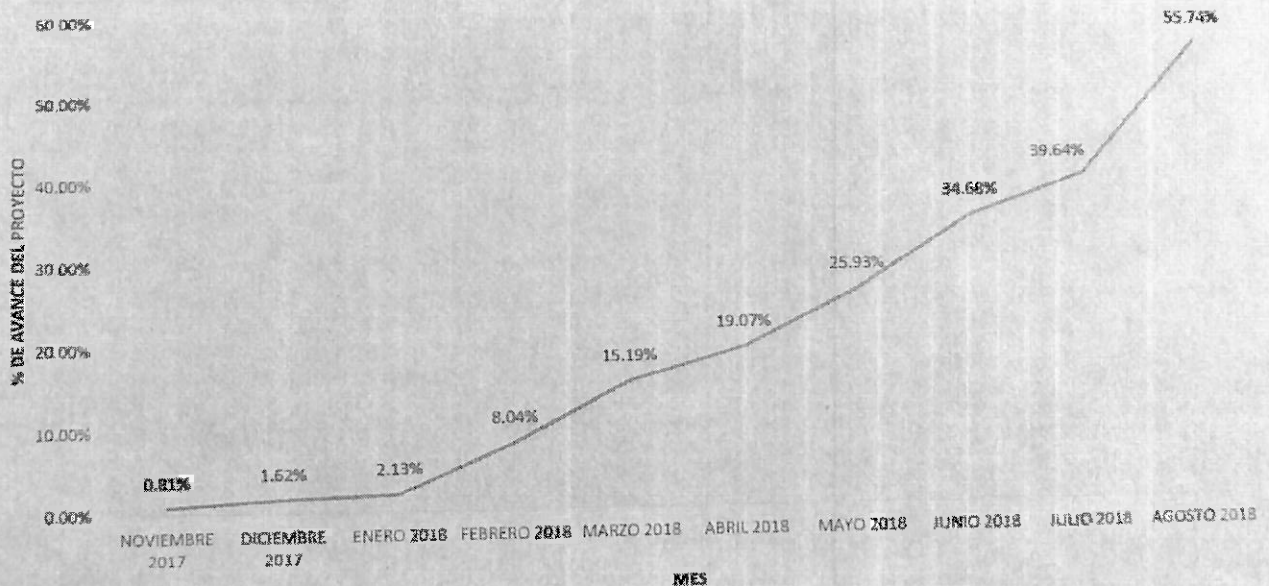




**AVANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, Y OBRA EXTERIOR
 AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

PRESUPUESTO FEDERAL AUTORIZADO \$ 36'594,542.92 CON IVA

MES	ORIGEN	MONTO EJERCIDO	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO
NOVIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 256,375.04	\$ 256,375.04	0.81%	0.81%
DICIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 256,197.84	\$ 512,572.88	0.81%	1.62%
ENERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 158,425.26	\$ 670,998.14	0.50%	2.13%
	OBRA	\$ -	\$ 670,998.14	0.00%	
	DRO	\$ -	\$ 670,998.14	0.00%	
FEBRERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 201,883.48	\$ 872,881.62	0.64%	8.04%
	OBRA	\$ 1,662,698.05	\$ 2,535,579.67	5.27%	
	DRO	\$ -	\$ 2,535,579.67	0.00%	
MARZO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 192,548.07	\$ 2,728,127.74	0.61%	15.19%
	OBRA	\$ 1,919,253.01	\$ 4,647,380.75	6.08%	
	DRO	\$ 144,757.24	\$ 4,792,137.99	0.46%	
ABRIL 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 195,719.16	\$ 4,987,857.15	0.62%	19.07%
	OBRA	\$ 985,601.51	\$ 5,973,458.66	3.12%	
	DRO	\$ 43,241.51	\$ 6,016,700.17	0.14%	
MAYO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 224,636.51	\$ 6,241,336.68	0.71%	25.93%
	OBRA	\$ 1,923,368.92	\$ 8,164,705.60	6.10%	
	DRO	\$ 15,781.10	\$ 8,180,486.70	0.05%	
JUNIO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 209,597.12	\$ 8,390,083.82	0.66%	34.68%
	OBRA	\$ 2,540,212.12	\$ 10,930,295.94	8.05%	
	DRO	\$ 9,468.66	\$ 10,939,764.60	0.03%	
JULIO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 270,698.41	\$ 11,210,463.01	0.86%	39.64%
	OBRA	\$ 1,283,217.16	\$ 12,493,680.17	4.07%	
	DRO	\$ 12,624.68	\$ 12,506,304.85	0.04%	
AGOSTO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 282,564.42	\$ 12,788,869.27	0.90%	55.74%
	OBRA	\$ 4,796,988.48	\$ 17,585,857.75	15.21%	
	DRO	\$ -	\$ 17,585,857.75	0.00%	

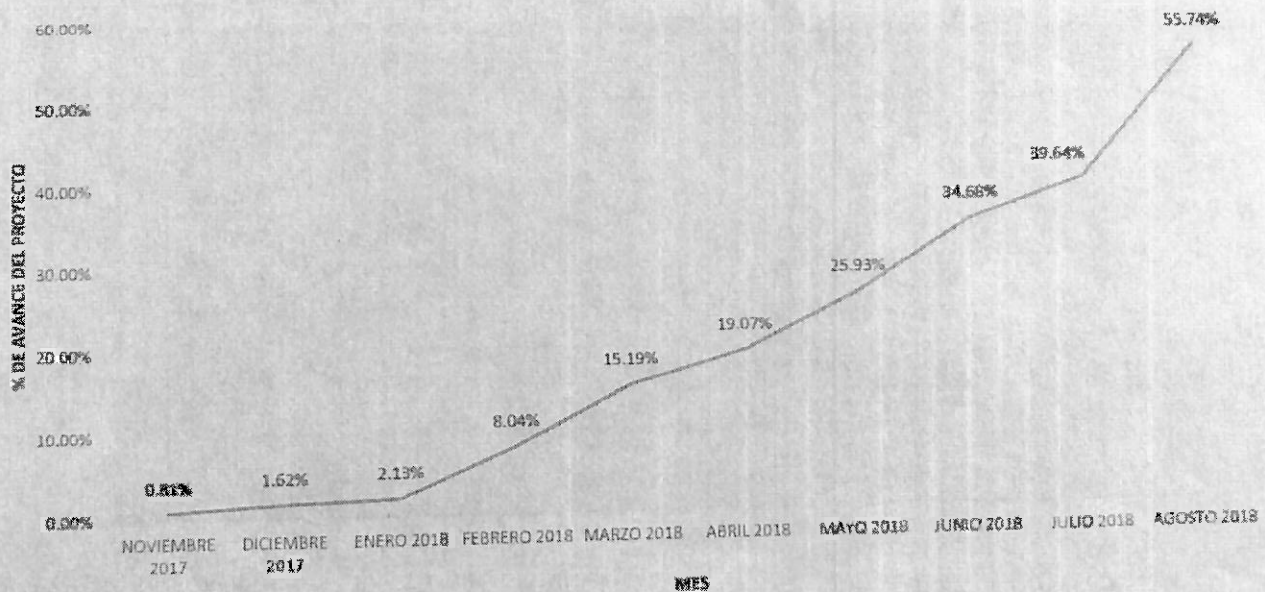




Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México
INSTITUTO TECNOLÓGICO GUSTAVO A. MADERO



AVANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, Y OBRA EXTERIOR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PRESUPUESTO FEDERAL AUTORIZADO \$ 36'594,542.92 CON IVA

MES	ORIGEN	MONTO EJERCIDO	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO
NOVIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 256,375.04	\$ 256,375.04	0.81%	0.81%
DICIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 256,197.84	\$ 512,572.88	0.81%	1.62%
ENERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 158,425.26	\$ 670,998.14	0.50%	2.13%
	OBRA	\$ -	\$ 670,998.14	0.00%	
	DRO	\$ -	\$ 670,998.14	0.00%	
FEBRERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 201,883.48	\$ 872,881.62	0.64%	8.04%
	OBRA	\$ 1,662,698.05	\$ 2,535,579.67	5.27%	
	DRO	\$ -	\$ 2,535,579.67	0.00%	
MARZO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 192,548.07	\$ 2,728,127.74	0.61%	15.19%
	OBRA	\$ 1,919,253.01	\$ 4,647,380.75	6.08%	
	DRO	\$ 144,757.24	\$ 4,792,137.99	0.46%	
ABRIL 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 195,719.16	\$ 4,987,857.15	0.62%	19.07%
	OBRA	\$ 985,601.51	\$ 5,973,458.66	3.12%	
	DRO	\$ 43,241.51	\$ 6,016,700.17	0.14%	
MAYO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 224,636.51	\$ 6,241,336.68	0.71%	25.93%
	OBRA	\$ 1,923,368.92	\$ 8,164,705.60	6.10%	
	DRO	\$ 15,781.10	\$ 8,180,486.70	0.05%	
JUNIO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 209,597.12	\$ 8,390,083.82	0.66%	34.68%
	OBRA	\$ 2,540,212.12	\$ 10,930,295.94	8.05%	
	DRO	\$ 9,468.66	\$ 10,939,764.60	0.03%	
JULIO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 270,698.41	\$ 11,210,463.01	0.86%	39.64%
	OBRA	\$ 1,283,217.16	\$ 12,493,680.17	4.07%	
	DRO	\$ 12,624.68	\$ 12,506,304.85	0.04%	
AGOSTO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 282,564.42	\$ 12,788,869.27	0.90%	55.74%
	OBRA	\$ 4,796,988.48	\$ 17,585,857.75	15.21%	
	DRO	\$ -	\$ 17,585,857.75	0.00%	
SEPTIEMBRE 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 274,002.16	\$ 17,859,859.91	0.87%	75.20%
	OBRA	\$ 5,863,023.67	\$ 23,722,883.58	18.59%	
	DRO	\$ -	\$ 23,722,883.58	0.00%	

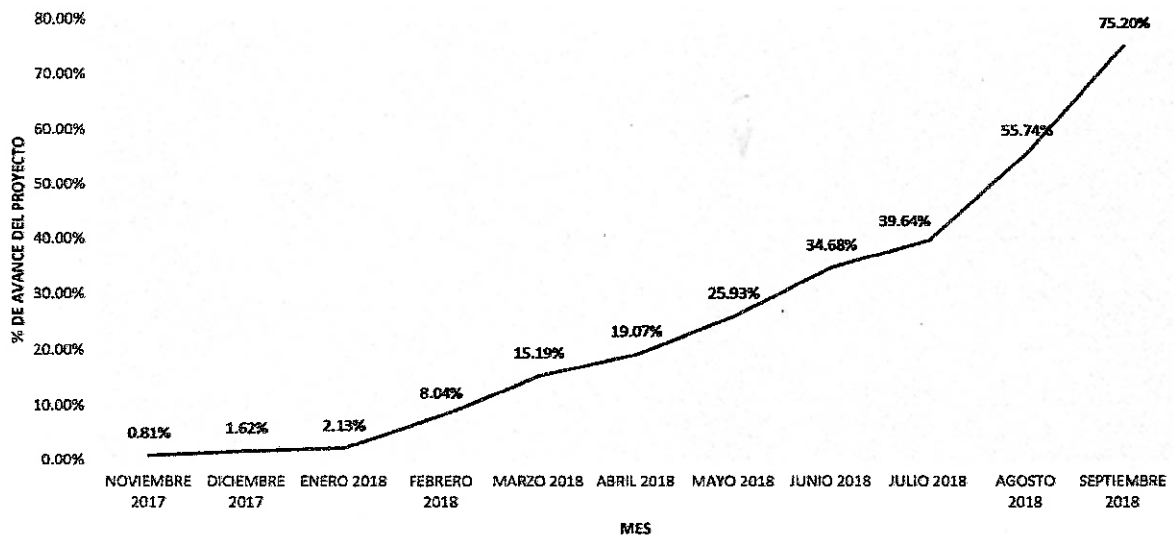




**AVANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, Y OBRA EXTERIOR
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

PRESUPUESTO FEDERAL AUTORIZADO \$ 36'594,542.92 CON IVA

MES	ORIGEN	MONTO EJERCIDO	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO
NOVIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 256,375.04	\$ 256,375.04	0.81%	0.81%
DICIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 256,197.84	\$ 512,572.88	0.81%	1.62%
ENERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 158,425.26	\$ 670,998.14	0.50%	2.13%
	OBRA	\$ -	\$ 670,998.14	0.00%	
	DRO	\$ -	\$ 670,998.14	0.00%	
FEBRERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 201,883.48	\$ 872,881.62	0.64%	8.04%
	OBRA	\$ 1,662,698.05	\$ 2,535,579.67	5.27%	
	DRO	\$ -	\$ 2,535,579.67	0.00%	
MARZO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 192,548.07	\$ 2,728,127.74	0.61%	15.19%
	OBRA	\$ 1,919,253.01	\$ 4,647,380.75	6.08%	
	DRO	\$ 144,757.24	\$ 4,792,137.99	0.46%	
ABRIL 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 195,719.16	\$ 4,987,857.15	0.62%	19.07%
	OBRA	\$ 985,601.51	\$ 5,973,458.66	3.12%	
	DRO	\$ 43,241.51	\$ 6,016,700.17	0.14%	
MAYO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 224,636.51	\$ 6,241,336.68	0.71%	25.93%
	OBRA	\$ 1,923,358.99	\$ 8,164,705.60	6.10%	
	DRO	\$ 15,781.10	\$ 8,180,486.70	0.05%	
JUNIO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 209,597.12	\$ 8,390,083.82	0.66%	34.68%
	OBRA	\$ 2,540,212.12	\$ 10,930,295.94	8.05%	
	DRO	\$ 9,468.66	\$ 10,939,764.60	0.03%	
JULIO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 270,698.41	\$ 11,210,463.01	0.86%	39.64%
	OBRA	\$ 1,283,217.16	\$ 12,493,680.17	4.07%	
	DRO	\$ 12,624.68	\$ 12,506,304.85	0.04%	
AGOSTO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 282,564.42	\$ 12,788,869.27	0.90%	55.74%
	OBRA	\$ 4,796,988.48	\$ 17,585,857.75	15.21%	
	DRO	\$ -	\$ 17,585,857.75	0.00%	
SEPTIEMBRE 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 274,002.16	\$ 17,859,859.91	0.87%	75.20%
	OBRA	\$ 5,863,023.67	\$ 23,722,883.58	18.59%	
	DRO	\$ -	\$ 23,722,883.58	0.00%	

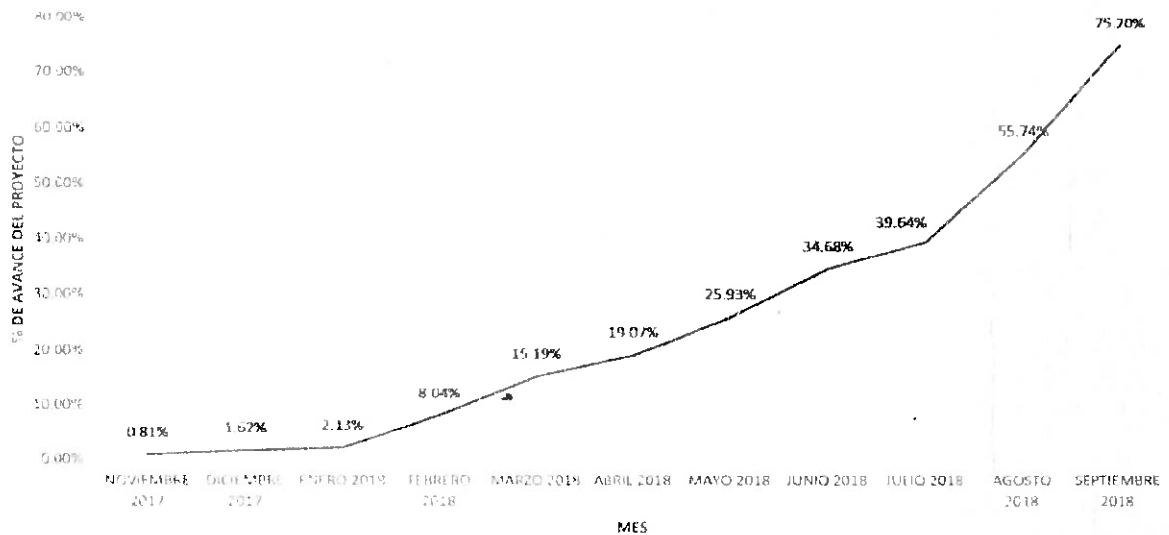



AVANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIÓNAL DE TALLERES Y LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PRESUPUESTO FEDERAL AUTORIZADO \$ 36,245,501.47 (M.D.C.)

MES	ORIGEN	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO
ENERO 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	0.7%	0.7%
FEBRERO 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 214,000.00	\$ 464,000.00	1.3%	1.3%
MARZO 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 156,475.20	\$ 620,475.20	1.7%	1.7%
ABRIL 2017	OBRA	\$ 0.00	\$ 620,475.20	1.7%	1.7%
MAYO 2017	OBRA	\$ 0.00	\$ 620,475.20	1.7%	1.7%
JUNIO 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 201,665.48	\$ 822,140.68	2.3%	2.3%
JULIO 2017	OBRA	\$ 1,667,695.09	\$ 2,489,835.77	6.9%	6.9%
AUGUSTO 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 132,718.07	\$ 2,622,553.84	7.2%	7.2%
SEPTIEMBRE 2017	OBRA	\$ 1,214,253.13	\$ 3,836,806.97	10.6%	10.6%
OCTUBRE 2017	OBRA	\$ 144,757.24	\$ 3,981,564.21	11.0%	11.0%
NOVIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 107,219.16	\$ 4,088,783.37	11.3%	11.3%
DICIEMBRE 2017	OBRA	\$ 985,601.51	\$ 5,074,384.88	14.0%	14.0%
ENERO 2018	OBRA	\$ 11,241.51	\$ 5,085,626.39	14.0%	14.0%
FEBRERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 124,636.31	\$ 5,210,262.70	14.4%	14.4%
MARZO 2018	OBRA	\$ 1,111,368.92	\$ 6,321,631.62	17.4%	17.4%
ABRIL 2018	OBRA	\$ 1,578,110.00	\$ 7,900,741.62	21.8%	21.8%
MAYO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 190,017.17	\$ 8,090,758.79	22.3%	22.3%
JUNIO 2018	OBRA	\$ 2,640,212.12	\$ 10,730,970.91	29.6%	29.6%
JULIO 2018	OBRA	\$ 1,158,866.00	\$ 11,889,836.91	32.8%	32.8%
AUGUSTO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 56,010.70	\$ 12,445,847.61	34.3%	34.3%
SEPTIEMBRE 2018	OBRA	\$ 1,163,117.70	\$ 13,608,965.31	37.5%	37.5%
OCTUBRE 2018	OBRA	\$ 1,104,680.00	\$ 14,713,645.31	40.6%	40.6%
NOVIEMBRE 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 78,496.96	\$ 14,792,142.27	40.8%	40.8%
DICIEMBRE 2018	OBRA	\$ 1,111,368.13	\$ 15,903,510.40	43.9%	43.9%
ENERO 2019	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 11,172.13	\$ 15,914,682.53	43.9%	43.9%
FEBRERO 2019	OBRA	\$ 1,111,368.13	\$ 17,026,050.66	47.0%	47.0%
MARZO 2019	OBRA	\$ 1,111,368.13	\$ 18,137,418.79	50.0%	50.0%
ABRIL 2019	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 11,172.13	\$ 18,148,590.92	50.0%	50.0%
MAYO 2019	OBRA	\$ 1,111,368.13	\$ 19,259,959.05	53.1%	53.1%
JUNIO 2019	OBRA	\$ 1,111,368.13	\$ 20,371,327.18	56.2%	56.2%
JULIO 2019	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 11,172.13	\$ 20,382,499.31	56.2%	56.2%
AUGUSTO 2019	OBRA	\$ 1,111,368.13	\$ 21,493,867.44	59.3%	59.3%
SEPTIEMBRE 2019	OBRA	\$ 1,111,368.13	\$ 22,605,235.57	62.4%	62.4%
OCTUBRE 2019	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 11,172.13	\$ 22,616,407.70	62.4%	62.4%
NOVIEMBRE 2019	OBRA	\$ 1,111,368.13	\$ 23,727,775.83	65.5%	65.5%
DICIEMBRE 2019	OBRA	\$ 1,111,368.13	\$ 24,839,143.96	68.6%	68.6%


NOTA: LA INFORMACIÓN DE AVANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIÓNAL DE TALLERES Y LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR SE PRESENTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO COMO UN RESUMEN DE LOS DATOS DE AVANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIÓNAL DE TALLERES Y LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AVANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIÓNAL DE TALLERES Y LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR. EL AVANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIÓNAL DE TALLERES Y LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR SE PRESENTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO COMO UN RESUMEN DE LOS DATOS DE AVANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIÓNAL DE TALLERES Y LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AVANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIÓNAL DE TALLERES Y LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR.



**AVANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, Y OBRA EXTERIOR
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

PRESUPUESTO FEDERAL AUTORIZADO \$ 36,593,512.32 (CERO)

MES	ORIGEN	MONTO EJECUCION	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO
ENERO 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 256,375.04	\$ 256,375.04	0.71%	0.71%
ENERO 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 256,375.04	\$ 512,750.08	1.42%	1.42%
ENERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 150,425.24	\$ 670,998.14	1.84%	1.84%
	OBRA	\$	\$ 670,998.14	1.84%	1.84%
	ORD	\$	\$ 670,998.14	1.84%	1.84%
FEBRERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 201,884.48	\$ 872,881.62	2.39%	2.39%
	OBRA	\$ 1,667,698.05	\$ 2,545,579.67	7.00%	7.00%
	ORD	\$	\$ 2,545,579.67	7.00%	7.00%
MARZO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 197,538.07	\$ 3,728,117.74	10.21%	10.21%
	OBRA	\$ 1,919,253.67	\$ 4,647,380.71	12.73%	12.73%
	ORD	\$ 144,757.74	\$ 4,792,137.99	13.13%	13.13%
ABRIL 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 389,749.16	\$ 5,181,887.15	14.19%	14.19%
	OBRA	\$ 985,601.51	\$ 6,073,458.66	16.61%	16.61%
	ORD	\$ 44,741.51	\$ 6,016,700.17	16.46%	16.46%
MAYO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 24,636.31	\$ 6,241,336.68	17.07%	17.07%
	OBRA	\$ 1,117,368.97	\$ 7,364,705.60	20.13%	20.13%
	ORD	\$ 1,151.10	\$ 7,364,705.60	20.13%	20.13%
JUNIO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 199,017.27	\$ 7,563,722.87	20.68%	20.68%
	OBRA	\$ 1,640,242.12	\$ 9,003,964.99	24.63%	24.63%
	ORD	\$ 4,488.66	\$ 9,008,453.65	24.64%	24.64%
JULIO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 186,910.70	\$ 9,195,364.35	25.14%	25.14%
	OBRA	\$ 1,387,117.16	\$ 10,482,571.51	28.65%	28.65%
	ORD	\$ 11,674.68	\$ 10,494,246.19	28.68%	28.68%
AUGUSTO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 276,496.96	\$ 10,770,743.15	29.45%	29.45%
	OBRA	\$ 1,136,388.48	\$ 11,607,131.63	31.78%	31.78%
	ORD	\$	\$ 11,607,131.63	31.78%	31.78%
SEPTIEMBRE 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 11,351.10	\$ 11,619,082.73	31.82%	31.82%
	OBRA	\$ 1,013,621.67	\$ 12,632,704.40	34.56%	34.56%
	ORD	\$	\$ 12,632,704.40	34.56%	34.56%
OCTUBRE 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 1,013,621.67	\$ 13,646,326.07	37.31%	37.31%
	OBRA	\$ 1,892,448.56	\$ 15,538,774.63	42.51%	42.51%
	ORD	\$	\$ 15,538,774.63	42.51%	42.51%
NOVIEMBRE 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 252,864.67	\$ 15,791,639.30	43.19%	43.19%
	OBRA	\$ 1,641,600.98	\$ 17,173,240.28	46.98%	46.98%
	ORD	\$	\$ 17,173,240.28	46.98%	46.98%
DICIEMBRE 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 241,284.94	\$ 16,031,955.34	43.85%	43.85%
	OBRA	\$ 1,175,000.10	\$ 17,206,955.44	47.03%	47.03%
	ORD	\$	\$ 17,206,955.44	47.03%	47.03%
OTROS PERIÓDOS	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 149,056.06	\$ 17,356,011.50	47.46%	47.46%
	OBRA	\$ 1,417,501.32	\$ 18,773,512.82	51.35%	51.35%
	ORD	\$	\$ 18,773,512.82	51.35%	51.35%

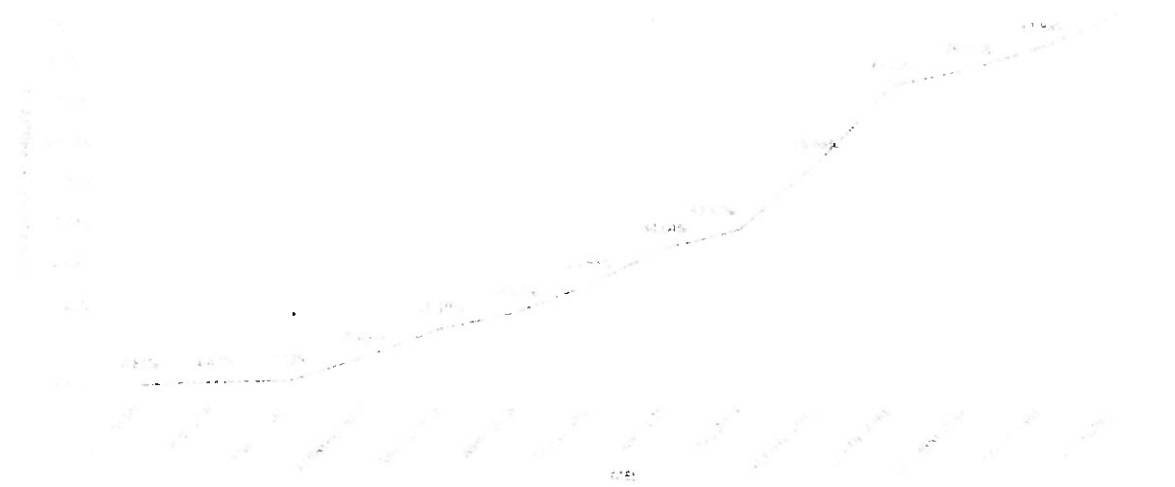

NOTA EXPLICATIVA: LOS DATOS DE OBRA QUE SE REFLECTAN SON EN VALORES NOMINALES, DE ACUERDO A LOS DATOS DE LOS PRESUPUESTOS FEDERALES AUTORIZADOS Y DE LOS PRESUPUESTOS DE EJECUCION DE PROYECTOS Y DE LOS DATOS DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE ADQUIEREN LA RESERVA ASIGNADA EN EL PRESUPUESTO FEDERAL AUTORIZADO. LOS DATOS DE OBRA QUE SE REFLECTAN SON EN VALORES NOMINALES, DE ACUERDO A LOS DATOS DE LOS PRESUPUESTOS FEDERALES AUTORIZADOS Y DE LOS PRESUPUESTOS DE EJECUCION DE PROYECTOS Y DE LOS DATOS DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE ADQUIEREN LA RESERVA ASIGNADA EN EL PRESUPUESTO FEDERAL AUTORIZADO.
